

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO – MEC
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CAMPINA GRANDE – UFCG
PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
COORDENAÇÃO DE FISCALIZAÇÃO

RELATÓRIO FOTOGRÁFICO
(MEDIÇÃO Nº6)

OBRA	Manutenção predial – Campus Cajazeiras - UFCG
LOCAL	UFCG – Cajazeiras - PB
CONTRATO	
CONTRATADA	ENGPAC-Engenharia de Avaliações, Perícias e Construções LTDA.

17/05/2021



Aplicação de selador, lixamento e pintura com verniz nas portas.



Aplicação de massa de areia e cimento na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina



Aplicação de massa acrílica e selador na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.

18/05/2021



Aplicação de massa de areia e cimento na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina



Aplicação de selador, lixamento e pintura com verniz nas esquadrias.



Aplicação de selador na fachada do bloco de laboratório de práticas medicina.

19/05/2021



Aplicação de selador na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.



Substituição de tomadas.



Pintura com tinta látex acrílica na fachada do Laboratório de Práticas Medicina.

20/05/2021



Aplicação de selador e pintura com verniz nas portas.



Raspagem da camada de tinta solta na marquise da fachada do Bloco Laboratório de Práticas Medicina.



Pintura com tinta látex acrílica na fachada do Laboratório de Práticas Medicina.

21/05/2021



Aplicação de massa de areia e cimento na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.



Aplicação de selador e pintura com verniz nas portas.



Raspagem da camada de tinta solta e aplicação de selador na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.



Pintura com tinta látex acrílica na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.

24/05/2021



Aplicação de selador na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.



Pintura com tinta látex acrílica na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.



Pintura com verniz nas caixas de porta e alisar – Unidade de Educação.



Lavagem das calhas com jato para aplicação de impermeabilizante.

25/05/2021



Impermeabilização da calha do bloco Laboratório de Medicina.



Pintura com tinta látex acrílica na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.



Raspagem da camada de tinta solta do Bloco de Informática.

26/05/2021



Raspagem da camada de tinta solta do Bloco de Informática.



Aplicação de massa de areia e cimento na fachada do bloco de Laboratório de Práticas Medicina.



Aplicação de selador na fachada do Bloco de Informática.

27/05/2021



Raspagem da camada de tinta solta na fachada do Bloco de Informática.



Pintura da fachada do Bloco de Laboratório de Medicina.



Aplicação de massa de areia e cimento na fachada do Bloco de Informática.

28/05/2021



Corte na alvenaria e chumbamento de caixa 4''x2'' para tomadas na Biblioteca.



Lixamento e aplicação de selador na fachada do Bloco de Informática.



Remoção de manta asfáltica e limpeza de calha – CA1.

31/05/2021



Remoção de manta asfáltica e limpeza de calha – CA1.



Remoção de cerâmica de forma manual – WC Feminino do Central de Aulas.



Impermeabilização da calha do CA1 com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante.



Remoção de manta asfáltica e limpeza das calhas do CA1.




Impermeabilização das calhas com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante.



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual – WC Feminino do Central de Aulas.


02/06/2021

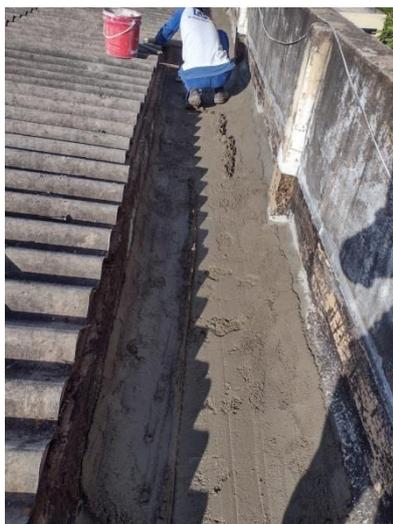

Impermeabilização das calhas com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante.



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual – WC Feminino do Central de Aulas.

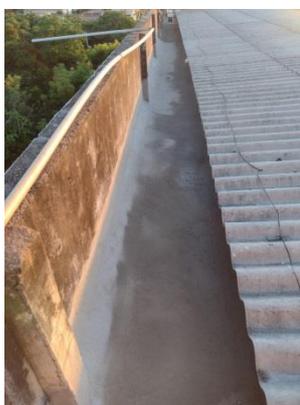

Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semiflexível 3 demãos –
Calhas do CA1.

04/06/2021



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual – WC Feminino do Central de Aulas.



Impermeabilização das calhas com argamassa de cimento e areia com aditivo impermeabilizante.



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual – WC Feminino do Central de Aulas.



Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semiflexível 3 demãos –
Calhas do CA1.

07/06/2021



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual – WC Feminino do Central de Aulas.



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual – WC Masculino do Central de Aulas.



Escavação de valas para instalação de caixas de passagem.



Aplicação de chapisco nas paredes que irão receber revestimento cerâmico – WC Feminino do Central de Aulas.

08/06/2021



Emboço para recebimento de cerâmica – WC Feminino do Central de Aulas.



Escavação de valas para instalação de caixas de passagem.



Impermeabilização de superfície com revestimento bicomponente semiflexível 3 demãos –
Calhas do CA1.




Instalação de lavatório de louça branca suspenso padrão popular – Ginásio.

09/06/2021



Demolição de pavimento e escavação de vala para instalação de caixa de passagem.

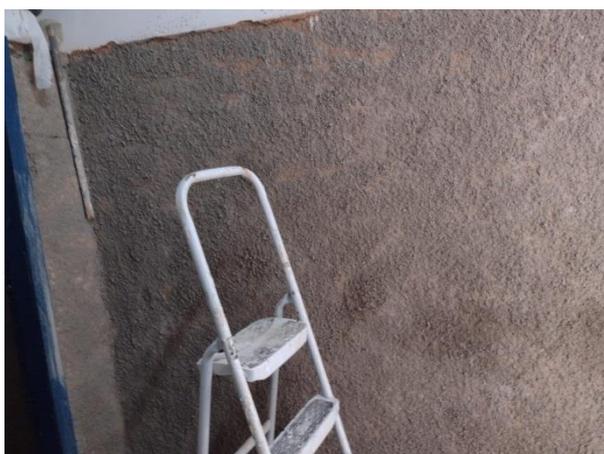

Aplicação de chapisco nas paredes que irão receber revestimento cerâmico – WC Feminino do Central de Aulas.



Demolição de revestimento cerâmico de forma manual – WC Masculino do Central de Aulas.



Instalação de caixa de passagem na rede de água fria – CA1.

10/06/2021



Emboço para recebimento de cerâmica e rasgo para realização de ponto de água fria – WC Feminino do Central de Aulas.



Escavação de vala para instalação de caixa de passagem - CA1.



Demolição de pavimento, escavação de vala e instalação de caixa de passagem na rede de água fria – CA1.

11/06/2021



Demolição de pavimento com reaproveitamento de paralelepípedos.



Demolição de pavimento, escavação de vala e instalação de caixa de passagem na rede de água fria – CA1.



Emboço para recebimento de cerâmica – WC Masculino do Central de Aulas.

14/06/2021



Demolição de pavimento e escavação de vala para instalação de caixa de passagem – CA2.



Demolição de pavimento com reaproveitamento de paralelepípedos – Por trás do Refeitório.

15/06/2021



Instalação de caixa de passagem na rede de água fria – Biblioteca.



Rasgo em alvenaria para passagem de pontos de água fria – WC Feminino do Central Acadêmico.



Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra – Por trás do refeitório.

16/06/2021



Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra – Por trás do refeitório.



Instalação de caixa de passagem na rede água fria – Biblioteca.



Instalação de torneira cromada de mesa – WC Feminino da Biblioteca.

17/06/2021



Aplicação de massa única em argamassa nas paredes do WC Feminino do Central Acadêmico.



Instalação de caixas de passagem na rede de água fria – Biblioteca.



Instalação de torneiras cromadas de mesa – Ginásio.

18/06/2021



Remoção de meio fio, com reaproveitamento de pedras.



Emboço para recebimento de cerâmica – WC Masculino do Central Acadêmico.



Demolição de pavimento, com reaproveitamento de pedras.

21/06/2021



Demolição de pavimento, com reaproveitamento de pedras.



Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra – Por trás do refeitório.



Demolição de alvenaria em bloco furado de forma manual – WC Feminino do Central Acadêmico.

22/06/2021



Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra – Por trás do refeitório.



Instalação de torneira cromada de parede – Refeitório.



Aplicação de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro feminino do Central Acadêmico.

23/06/2021



Instalação de torneiras cromadas de mesa – Refeitório.



Reassentamento de paralelepípedo sobre colchão de pó de pedra rejuntado com argamassa – Por trás do refeitório e próximo ao CA2.



Aplicação de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro feminino do Central Acadêmico.



Execução de meio fio em pedras graníticas – Por trás do refeitório.

25/06/2021



Execução de pontos de água fria – Banheiro feminino do Central de Aulas.



Execução de meio fio em pedras graníticas – Por trás do refeitório.



Remoção de manta asfáltica – Calha do CA1.



Aplicação de revestimento cerâmico nas paredes do banheiro feminino do Central Acadêmico.

Presidente da comissão de fiscalização

Função

PREFEITURA UNIVERSITÁRIA
